

| | | | |
|-------|---|------------|-----------|
| 임지구분 | 임기내 | 사업주체 | 한국전력 |
| 신규여부 | 신규사업 | 중앙정부 지원 | 제도적 지원 필요 |
| 예산구분 | 예산 | 사업이행도(진도율) | 정상추진(20%) |
| 주관부서 | 도로철도과 | 협업부서 | - |
| 공약실명제 | 과장 김창현(6250), 팀장 김영균(6770), 담당자 김경희(6893) | | |

□ 사업개요

- 구 간 : 중앙초등학교 ~ 시민탑 삼거리
- 사업기간 : 2018. 8. ~ 2021. 12.
- 사업량 : 선로 지중화 L=1.6km
 - 주요사업 : 한전 가공배전선로 지중화
 - 병행사업 : KT 및 LGU+(대표통신사) 외 4개 통신선로 지중화
- 총사업비 : 100억원(김천시 56억, 한전 및 통신사 44억)

□ 추진실적

- 1차분(중앙초등 ~ 국민은행) 공사 중
 - 사업량 : 선로 지중화 L=0.74km, 도로복구
 - 사업비 : 45억원(김천시 26억, 한전 및 통신사 19억)
 - 사업기간 : 2018. 8 ~ 2020. 12

□ 연차별 추진계획



| 연도별 | 주요 사업 내용 | 비고 |
|------|---|----|
| 2018 | - 1차분(중앙초등 ~ 국민은행) 착공 | |
| 2019 | - 1차분(중앙초등학교 ~ 국민은행) 60% 공정 완료 | |
| 2020 | - 1차분(중앙초등학교 ~ 국민은행) 공사 준공 - 2, 3차분(국민은행 ~ 시민탑삼거리) 협약 체결 | |
| 2021 | - 2, 3차분(국민은행 ~ 시민탑삼거리) 공사착공 | |
| 2022 | - 2, 3차분(국민은행 ~ 시민탑삼거리) 상반기 공사준공 | |

□ 연차별 투자수요

(단위:백만원)

| 재원별 | 총사업비 (A+B+C) | 기투자 (A) | 임기내 투자계획(B) | | | | | | 2022 하반기 이후 (C) |
|-----|-----------------|------------|-------------|------|------|------|-------|-------------|--------------------------|
| | | | 소계 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 상반기 | |
| 계 | 10,000 | 4,500 | 5,500 | | | | 2,800 | 2,700 | |
| 시비 | 5,600 | 2,600 | 3,000 | | | | 1,500 | 1,500 | |
| 기타 | 4,400 | 1,900 | 2,500 | | | | 1,300 | 1,200 | |

□ 위치도 및 사진대지

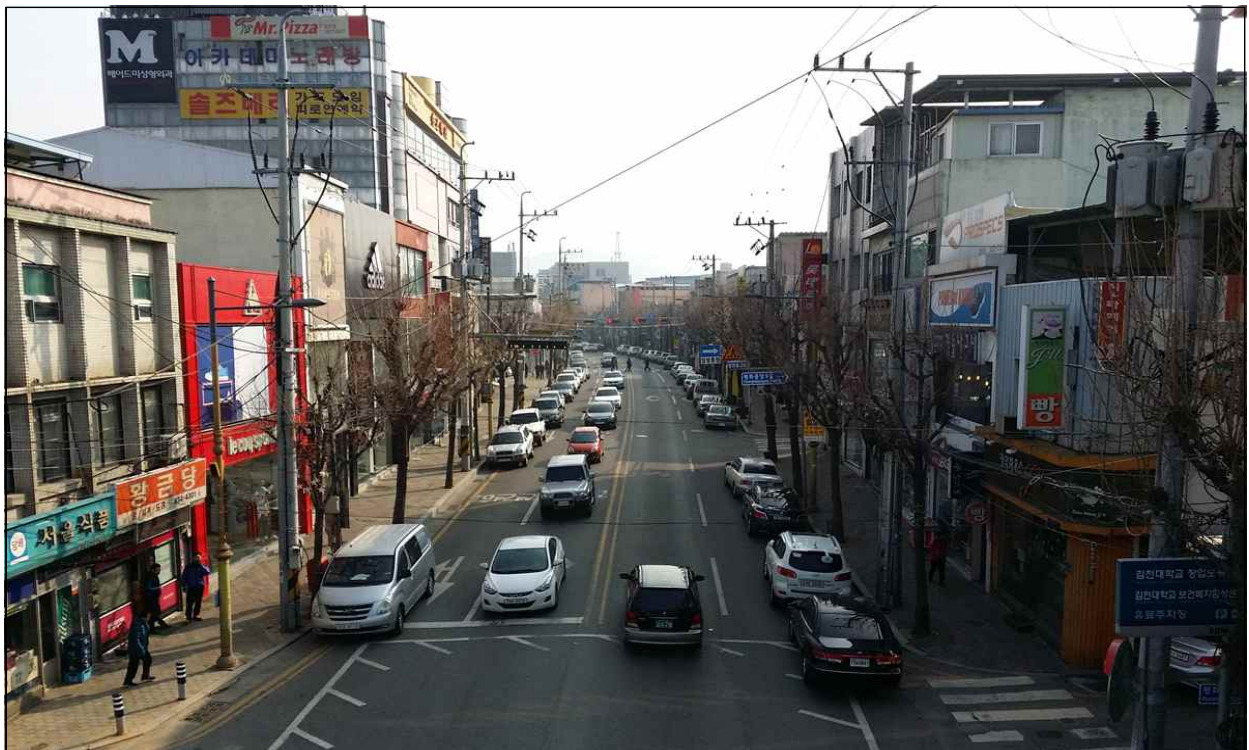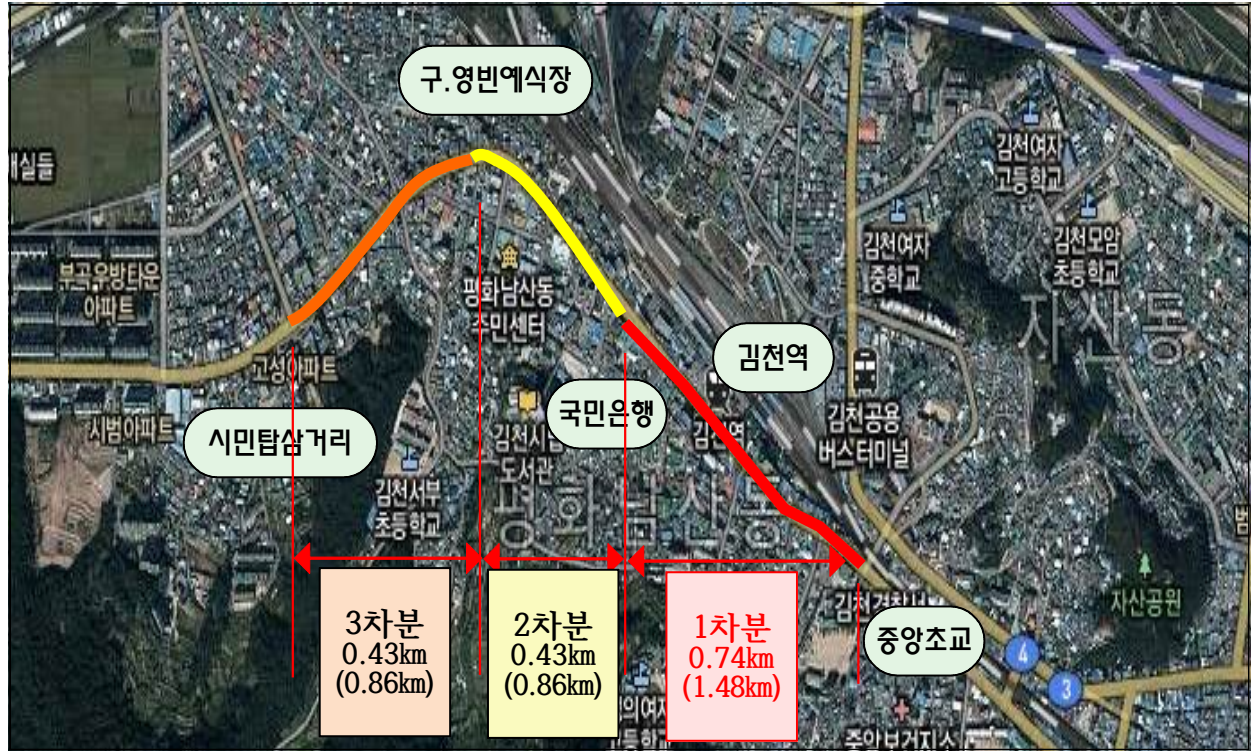

□ 문제점 및 대응계획

- 지상기기(변압기 등) 설치에 대하여 인근 상가 반대 및 민원
 - 1차구간(중앙초~국민은행)은 상가협의회와 협의 공용부지 등을 활용하여 위치 선정하였으나 인근상가 반대민원 지속
 - 2~3차 구간 동일 민원 발생 예상
- 도로포장 훼손 및 통행 불편에 따른 민원 과다 발생
 - 사업시행 전·후 주민설명회 개최등 협조 요청
 - 과다 굴착 지양 및 조속 복구 시행으로 불편 최소화

□ 기대효과

- 쾌적한 시가지 도로 환경조성으로 시민들의 삶의 질 향상
