

임지구분	임기내	사업주체	한국전력
신규여부	신규사업	중앙정부 지원	제도적 지원 필요
예산구분	예산	사업이행도(진도율)	정상추진(30%)
주관부서	도로철도과	협업부서	-
공약실명제	과장 김창현(6250), 팀장 김영균(6770), 담당자 김동관(6893)		

□ 사업개요

- 구 간 : 중앙초등학교 ~ 시민탑 삼거리
- 사업기간 : 2018. 8. ~ 2021. 12.
- 사업량 : 선로 지중화 L=1.6km
 - 주요사업 : 한전 가공배전선로 지중화
 - 병행사업 : KT 및 LGU+(대표통신사) 외 4개 통신선로 지중화
- 총사업비 : 100억원(김천시 56억, 한전 및 통신사 44억)

□ 추진실적

- 1차분(중앙초등 ~ 국민은행) 공사 중
 - 사업량 : 선로 지중화 L=0.74km, 도로복구
 - 사업비 : 45억원(김천시 26억, 한전 및 통신사 19억)
 - 사업기간 : 2018. 8 ~ 2020. 12
- 2차분(국민은행~시민탑삼거리) 사업 신청 ('20.7.)

□ 연차별 추진계획


연도별	주요사업내용	비고
2018	- 1차분(중앙초등 ~ 국민은행) 착공	
2019	- 1차분(중앙초등학교 ~ 국민은행) 60% 공정 완료	
2020	- 1차분(중앙초등학교 ~ 국민은행) 공사 준공 - 2, 3차분(국민은행 ~ 시민탑삼거리) 협약 체결	
2021	- 2, 3차분(국민은행 ~ 시민탑삼거리) 공사착공	
2022	- 2, 3차분(국민은행 ~ 시민탑삼거리) 상반기 공사준공	

□ 연차별 투자수요

(단위:백만원)

재원별	총사업비 (A+B+C)	기투자 (A)	임기내 투자계획(B)						2022 하반기 이후 (C)
			소계	2018	2019	2020	2021	2022 상반기	
계	10,000	4,500	5,500				2,800	2,700	
시비	5,600	2,600	3,000				1,500	1,500	
기타	4,400	1,900	2,500				1,300	1,200	

□ 위치도 및 사진대지

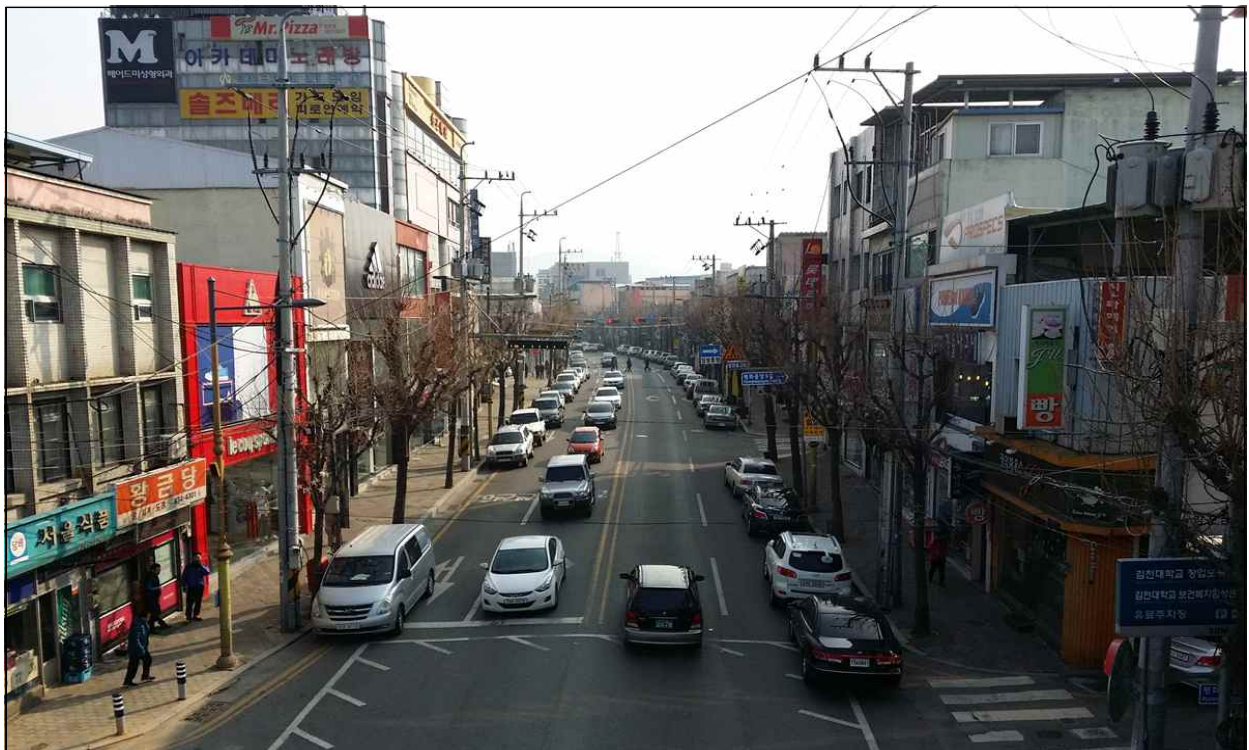

□ 문제점 및 대응계획

- 지상기기(변압기 등) 설치에 대하여 인근 상가 반대 및 민원
 - 1차구간(중앙초~국민은행)은 상가협의회와 협의 공용부지 등을 활용하여 위치 선정하였으나 인근상가 반대민원 지속
 - 2~3차 구간 동일 민원 발생 예상
- 도로포장 훼손 및 통행 불편에 따른 민원 과다 발생
 - 사업시행 전·후 주민설명회 개최등 협조 요청
 - 과다 굴착 지양 및 조속 복구 시행으로 불편 최소화

□ 기대효과

- 쾌적한 시가지 도로 환경조성으로 시민들의 삶의 질 향상
