

임지구분	임기내	사업주체	김천시
신규여부	지속사업	중앙정부 지원	제도적 지원 필요
예산구분	예산	사업이행도(진도율)	정상추진(60%)
주관부서	문화홍보실	협업부서	-
공약실명제	실장 손세영(6020), 팀장 이해정(6061), 담당자 지명선(6731)		

□ 사업개요

○ 사업목표

- 혁신도시 내 부족한 문화시설을 확충하여 주민들에게 제공함으로써 주민들의 다양한 문화적 수요를 충족하고 혁신도시의 정주여건 개선

○ 사업위치 : 김천시 율곡동 657번지 일원

○ 사업기간 : 2017년 ~ 2022년

○ 소요예산 : 363억원(국비 99, 도비 15, 시비 249)

○ 주요내용

- 규모 : 지하1층, 지상2층
(연면적 10,163.57㎡, 부지면적 8,287㎡)
- 주요시설 : 도서관, 다목적강당, 기타복합시설(청소년활동실, 휴게실 등)

□ 추진실적

- 2017년 1월 : 부지 매입완료(8,287㎡, 39억원)
- 2017년 7월 ~ 2018년 6월 : 건립기본계획 및 타당성용역 시행
- 2017년 9월 ~ 10월 : 시민의견조사((사)충남산업경제연구원)
- 2019년 4월 : 중앙투자심사 조건부 승인
- 2019년 6월 ~ 8월 : 건축설계공모 및 심의(조달청)
- 2019년 9월 : 기본 및 실시설계용역 착수
- 2020년 3월 ~ 5월 : 중앙투자심사 2단계, 지방건설기술심의, 건축심의, 각종 인증 등 절차 이행
- 2020년 6월 ~ 8월 : 공사 및 건설사업관리용역 조달 심사 및 입찰 진행
- 2020년 9월 ~ 10월 : 공사 및 건설사업관리용역 계약 및 착수

□ 연차별 실적/계획

연도별	주요사업내용	비고
2018	건립 기본계획 및 타당성조사용역 시행	
2019	중앙투자심사 절차 이행, 기본 및 실시설계용역 등 수행	
2020	중앙투자심사 2단계심사, 지방건설기술심의 등 수행, 공사 및 건설사업관리용역 착수	
2021	기반시설 및 건축, 통신, 전기, 소방공사 시행	
2022	사업 준공(예정)	


□ 연차별 투자수요

(단위:백만원)

재원별	총사업비 (A+B+C)	기투자 (A)	임기내 투자계획(B)						2022 하반기 이후 (C)
			소계	2018	2019	2020	2021	2022 상반기	
계	36,300	3,900	32,400	2,300	8,900	5,000	11,200	5,000	
국비	9,900		9,900	1,000	3,000	1,570	4330	-	
도비	1,500		1,500	300	900	300			
시비	24,900	3,900	21,000	1,000	5,000	3,130	6,870	5,000	
민자									
기타									

□ 조감도 및 배치계획



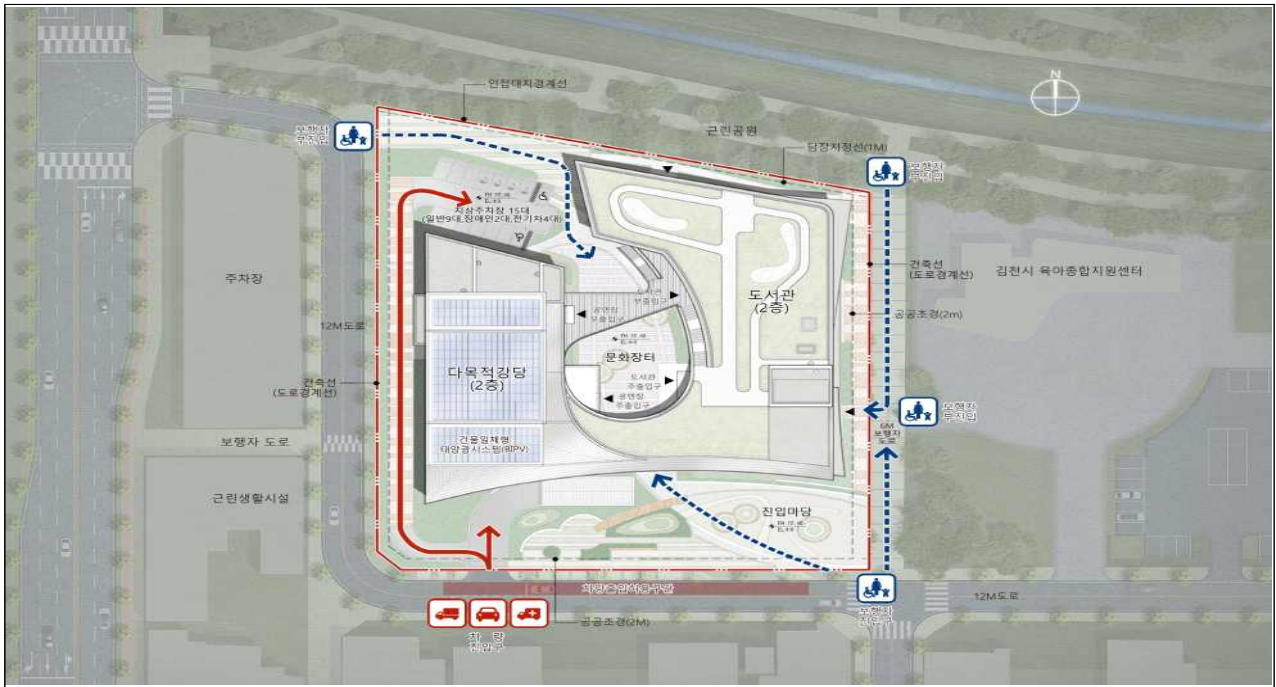

☐ 문제점 및 대응계획

○ 해당없음

☐ 기대효과

- 복합혁신센터 건립으로 혁신도시의 정주여건 개선과 활력 제공
- 혁신도시 내 문화 인프라 구축으로 주민들의 문화적 욕구 충족
