

임지구분	임기내	사업주체	김천시
신규여부	지속사업	중앙정부 지원	제도적 지원 필요
예산구분	예산	사업이행도(진도율)	정상추진(50%)
주관부서	문화홍보실	협업부서	-
공약실명제	실장 손세영(6020), 팀장 이해정(6061), 담당자 지명선(6731)		

□ 사업개요

○ 사업목표

- 혁신도시 내 부족한 문화시설을 확충하여 주민들에게 제공함으로써 주민들의 다양한 문화적 수요를 충족하고 혁신도시의 정주여건 개선

○ 사업위치 : 김천시 율곡동 657번지 일원

○ 사업기간 : 2017년 ~ 2022년

○ 소요예산 : 363억원(국비 99, 도비 15, 시비 249)

○ 주요내용

- 규 모 : 지하1층, 지상2층

(연면적 10,163.57㎡, 부지면적 8,287㎡)

- 주요시설 : 도서관, 다목적강당, 기타복합시설(청소년활동실, 휴게실 등)

□ 추진실적

○ 2017년 1월 : 부지 매입완료(8,287㎡, 39억원)

○ 2017년 7월 ~ 2018년 6월 : 건립기본계획 및 타당성용역 시행

○ 2017년 9월 ~ 10월 : 시민의견조사((사)충남산업경제연구원)

○ 2019년 4월 : 중앙투자심사 조건부 승인

○ 2019년 6월 ~ 8월 : 건축설계공모 및 심의(조달청)

○ 2019년 9월 : 기본 및 실시설계용역 착수

○ 2020년 3월 ~ 5월 : 중앙투자심사 2단계, 지방건설기술심의, 건축심의, 각종 인증 등 절차 이행

□ 연차별 실적/계획

연도별	주요사업내용	비고
2018	건립 기본계획 및 타당성조사용역 시행	
2019	중앙투자심사 절차 이행, 기본 및 실시설계용역 등 수행	
2020	중앙투자심사 2단계심사, 지방건설기술심의 등 수행, 기반시설 및 건축공사 착수(예정)	
2021	기반시설 및 건축공사 시행	
2022	사업 준공(예정)	


□ 연차별 투자수요

(단위:백만원)

재원별	총사업비 (A+B+C)	기투자 (A)	임기내 투자계획(B)						2022 하반기 이후 (C)
			소계	2018	2019	2020	2021	2022 상반기	
계	36,300	3,900	32,400	2,300	8,900	5,000	10,320	5,880	
국비	9,900		9,900	1,000	3,000	1,470	4,430		
도비	1,500		1,500	300	900	300			
시비	24,900	3,900	21,000	1,000	5,000	3,230	5,890	5,880	
민자									
기타									

□ 조감도 및 배치계획



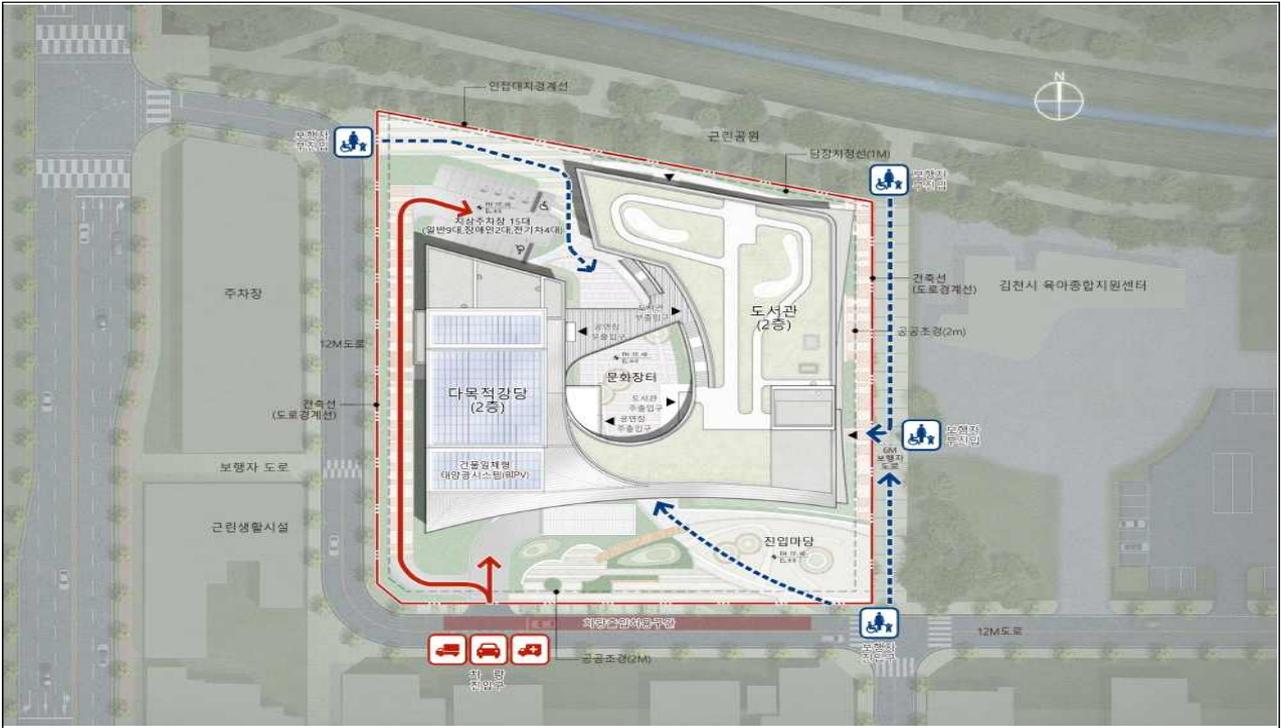

문제점 및 대응계획

- 해당없음

기대효과

- 복합혁신센터 건립으로 혁신도시의 정주여건 개선과 활력 제공
- 혁신도시 내 문화 인프라 구축으로 주민들의 문화적 욕구 충족
