

임지구분	임기내	사업주체	김천시
신규여부	지속사업	중앙정부 지원	예산지원 필요
예산구분	예산	사업이행도(진도율)	정상추진(30%)
주관부서	보건행정과	협업부서	원도심재생과 외
공약실명제	과장 홍용득(2701), 팀장 김인규(2703), 담당자 김용호(2714)		

□ 사업개요

- 사업목표 : 양질의 보건의료서비스 제공으로 임신에서부터 노년층까지 시민모두가 건강한 삶을 영위할 수 있도록 하고자 함
- 사업위치 : 김천시 평화동 298-3번지 외 11필지
- 사업기간 : 2020년 ~ 2023년(4년)
- 소요예산 : 384억원(국 41 도 10 시 333)
- 주요내용 : 연면적 12,137.8㎡(지하 1층, 지상 3층)
 - 분산된 보건업무 일원화(보건소, 중앙보건지소, 치매안심센터, 정신보건센터 등)

□ 추진실적

- 기본계획수립 및 타당성조사(위치·규모·건립방법 등 - 2019. 11.)
- 부지매입(회계과, 4,973.6㎡ - 2019. 12. 10.)
- 공유재산관리계획 변경승인(리모델링→신축 - 2020. 3.19.)
- 도시계획시설결정용역 추진 중(완료예정일 2020. 12.)

□ 연차별 실적/계획


연도별	주요사업내용	비고
2018	추진계획 수립, 공유재산관리계획(리모델링) 승인	
2019	건물 정밀안전진단(C등급), 기본계획수립 및 타당성 조사	
2020	추가부지 확보(1,773㎡), 건물 철거	
2021	설계공모, 기본설계 및 국도비 확보(2022년 교부 분)	
2022	실시설계 및 원가심사, 착공	2023 완공

□ 연차별 투자수요

(단위:백만원)

재원별	총사업비 (A+B+C)	기투자 (A)	임기내 투자계획(B)					2022 하반기 이후 (C)	
			소계	2018	2019	2020	2021		2022 상반기
계	38,400		17,150		50	2,800	1,700	12,600	21,250
국비	4,100		4,100					4,100	
도비	1,000		1,000					1,000	
시비	33,300		12,050		50	2,800	1,700	7,500	21,250

□ 위치도 및 사진대지

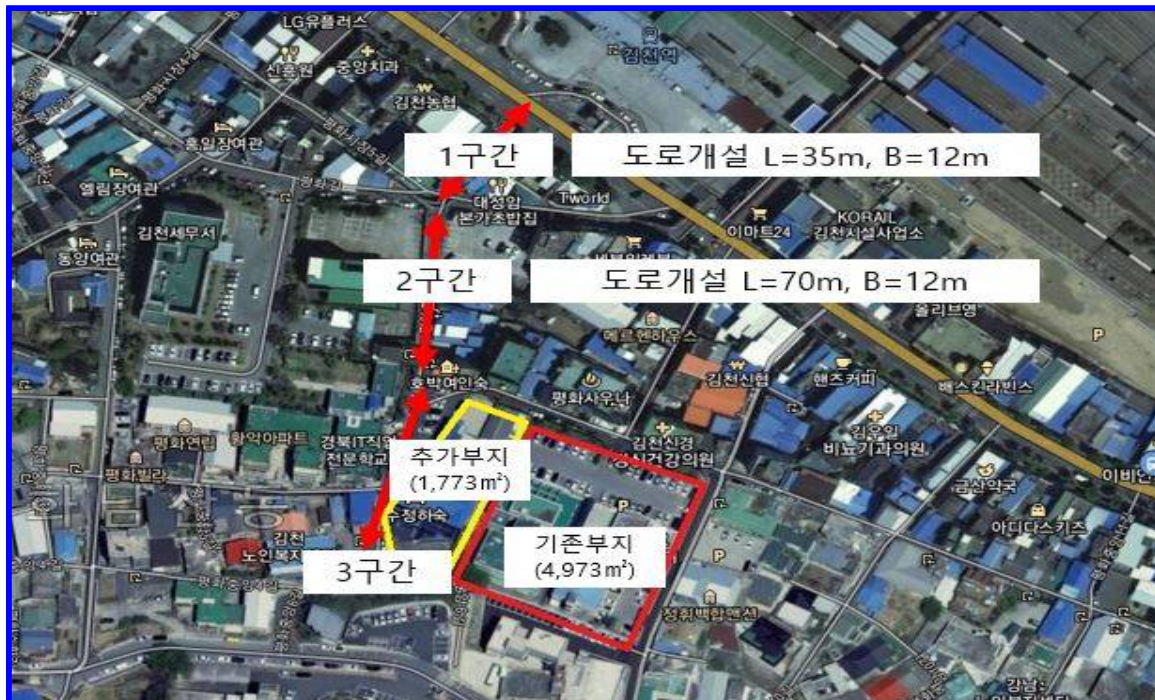

□ 문제점 및 대응계획

- 진입로 및 주변 도로 폭 협소로 교통문제 발생
 - ⇒ 도로 및 공공청사 도시계획시설 결정(용역 추진 중)
 - ⇒ 기존부지 일부 및 추가부지를 활용하여 교통문제 해결
 - ⇒ 1구간, 2구간 도로정비(원도심재생과), 3구간 확보 및 정비(보건행정과)

□ 기대효과

- 맞춤형 통합보건의료서비스 제공으로 시민들 삶의 질 향상
