# 2-2

# 김천시 농촌 신활력플러스사업

임기구분	임기이후	사업주체	김천시
신규여부	계속사업	중앙정부 지원	예산 지원 필요
예산구분	예산	사업이행도(진도율)	정상추진
주관부서	건설도시과	협업부서	경북도 농촌활력과
공약실명제	과장 배정현(6330),	팀장 현인(6322),	담당자 김영명(6773)

## □ 사업개요

○ 사업기간 : 2021. 1. ~ 2024. 12.(4년간)

○ 위 치 : 신음동 삼애2길 74번지(삼애원) 일원

○ 총사업비 : 7,449백만원(국비 4,900 시비 2,549)

O 사업내용

• 하드웨어 사업(H/W) : 한국농어촌공사 위탁

- 내 용 : 신활력센터 건립

- 면 적 : 건물 2동 A-1,999㎡, 야외 A-3,045㎡

- 용 도 : 건물 1동 - 다목적라운지 및 카페테리아, 건물 2동 - 연구실

및 사무관리공간, 야외-야외실험 및 체험교육 공간

• 휴먼웨어(Hn/W) 및 소프트웨어 사업(S/W) : 사업추진단(민간) 위탁

- 내 용 : 지역활성화 모임, 역량강화 교육, 공공서비스 운영 등

### □ 추진실적

O 21. 7. 기본계획 수립 용역 착수

○ 21. 12. 사업 운영 및 추진단 설치 조례 제정

○ 22. 1. 사무국 구성

○ 23. 11. 기본계획 승인(농식품부)

# □ 연차별 추진실적/계획


연도	주요사업내용		
2023	· 기본계획 숭인 및 고시(2023.11.)		
2024	· 신활력센터(웰라이프 파밍필드) 조성, S/W사업 추진		
2025	· 사업완료, 운영 · 관리 단계		

# □ 연차별 투자수요


#### (단위:백만원)

재워먼	총사업비	기투자	임기 내 투자계획(B)					2026 하반기	
	(A+B+C)	(A)	소계	2022	2023	2024	2025	2026 상반기	이후 (C)
계	7,283	-				-	-	-	-
국비	4,900	980	3,920	1,470	980	1,470	-	-	-
도비	_	-	-	-	-	-	-	-	-
시비	2,100	420	1,680	630	420	630	-	-	-
민자	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기타	283	23	260	118	-	142	-	-	-

## □ 종합구상도

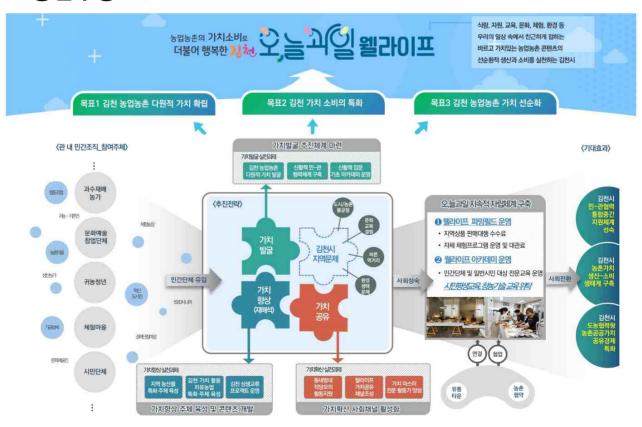

## □ H/W사업(파밍필드) 위치도 및 계획도

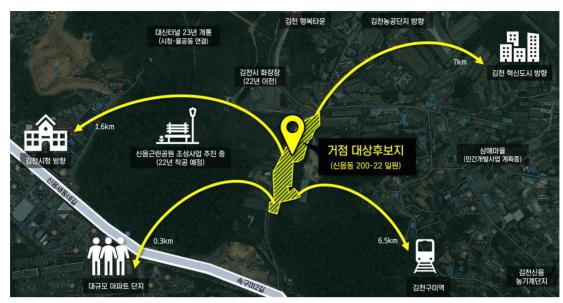

[파밍필드 후보지 입지현황도]



[평면계획도]



[파밍필드 조감도]

## □ 문제점 및 대응조치/계획

- 추진단의 위수탁협의 해지, 재구성 등으로 사업이 지연
- 2023년 6월 추진단을 재구성, 11월 기본계획 승인(농식품부)
- 2024년부터 기본계획에 따라 사업 정상 추진

## □ 기대효과

- 다양한 지역자산과 민간 자생조직을 활용하여 산업 고도화, 일자리 창출 등이 가능한 자립적 지역발전 기반구축
- 농산물 종합유통타운과 연계한 시너지 효과 창출

- □ 변경사항 : 해당 없음
- □ 이행내용 : 정상추진
  - 당초 이행지표 : 2021~2023년 조례제정 및 기본계획 수립
    - → 2021년 조례제정, 2023. 8월 기본계획 승인

